




(実験開始から617日経過)

- 区画⑤（セメント系）において、再設置工事完了後、約2ヶ月が経過しました。（10月4日設置）

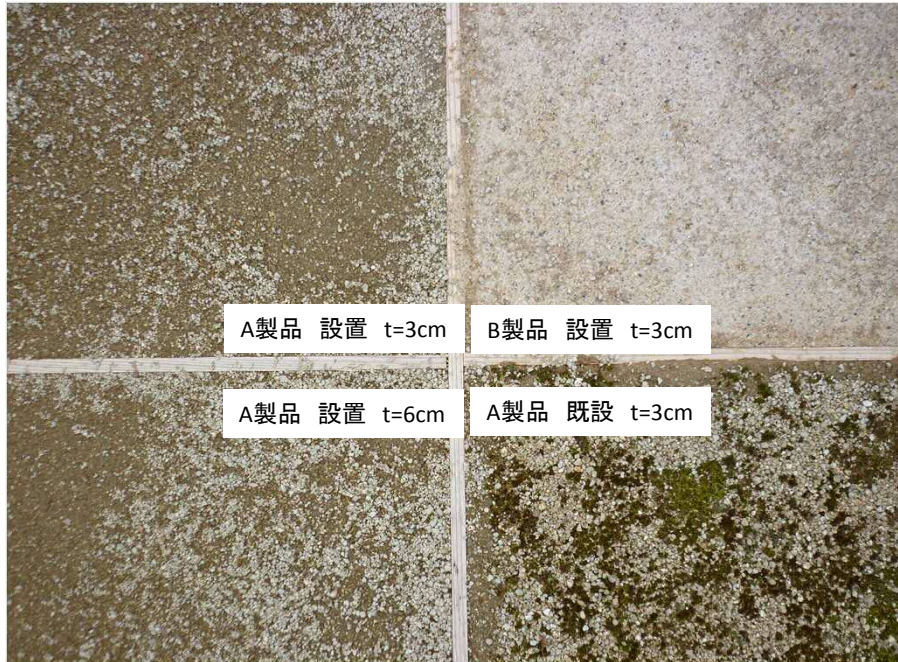

- 再設置したA製品の3cmと6cmの箇所ですが、硬度計が示すとおり十分な硬度を保っています。
12月に入りこれから気温が下がっていくので、注意深く観察を続けていきます。

硬度計により測定

メッシュ1	35mm	A製品 設置 t=3cm
メッシュ2	38mm	
メッシュ3	37mm	A製品 設置 t=6cm
メッシュ4	18mm	

